Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE VIABILITA'

MESSA IN SICUREZZA A TRATTI SALTUARI DELLA S.P. N. 33 DA FINE ABITATO DI SAMUGHEO A LIMITE PROVINCIA NUORO

CUP: F87H22004580001

PROGETTO ESECUTIVO

Il committente Provincia di Oristano Settore Viabilità Dirigente Responsabile Ing. Giuseppe Pinna	Il Responsabile del Procedimento Geom. Pier Paola Corrias	Verifica progettazione
Studio di Ingegneria Civile Ing. Raimondo MANCA Via Cagliari, 56 - 09170 - Oristano tel. 0783 649145 - cell. 349 7513442 - fax 07831920142 e.mail: ing.manca@tiscali.it PEC: raimondo.manca@ingpec.eu	Il progettista Ing. Raimondo Manca	data: MARZO 2025 / approvazione / formato: A1 aggiornamenti file: 185-ES-01.05 / diseg. da: R.M.
titolo **ABACO DELLA SEGNALETICA**		serie: 1.8.5 / scala: INDICATA / tavola: 6

D:\ARCHIVIO\LAVORI\185-SP33\2-ESECUTIVO\DISEGNI

NUM	PROGRES-SIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSER-VAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
1	21+772	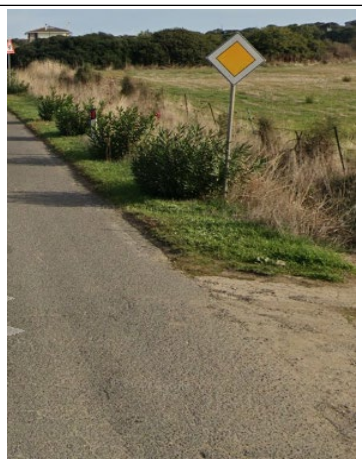	accettabile		
2	21+922		segnale pericolo incrocio ruotato	rotazione e riposiziona-mento e fissaggio segnale di pericolo incrocio	
3	21+968	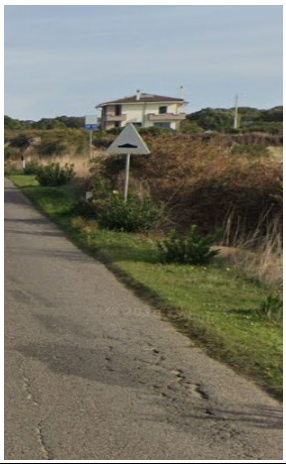	sbiadito	segnale di pericolo dosso da sostituire .	
4	22+000		cippo chilometrico sbiadito	cippo chilometrico da sostituire	

NUM	PROGRES-SIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSER-VAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
5	22+059		segnale di fine limite di velocità sbiadito	segnale di fine limite di velocità da sostituire	
6	22+202		sbiadito e fuori piombo	segnale da sostituire	
7	22+270	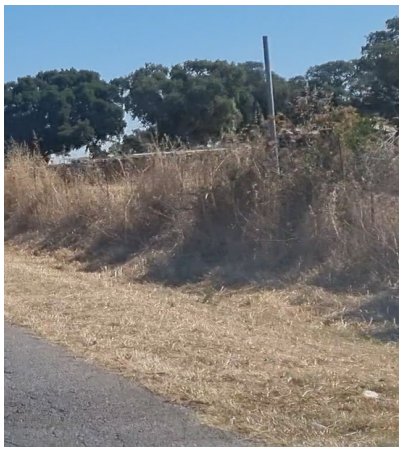	assente cartello di segnalazione incrocio ma presente il sostegno	fornitura e posa segnale pericolo incrocio .	
8	22+532		segnale di divieto sbiadito segnale di indicazione da sostituire	rimozione segnale di indicazione sostituzione limite di velocità, fissaggio segnale di divieto	

NUM	PROGRES-SIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSER-VAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
9	22+890	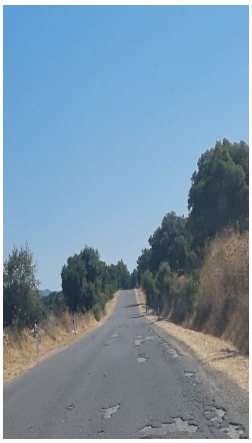	segnale di pericolo incrocio assente	fornitura e posa segnale pericolo incrocio + sostegno .	
10	23+000	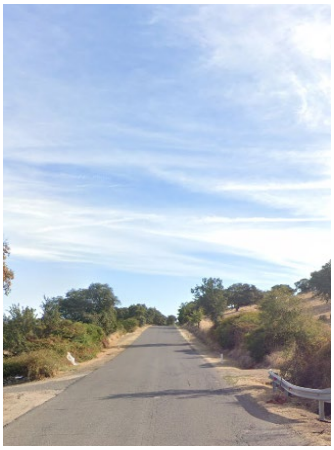	cippo chilometrico assente	fornitura e posa di cippo chilometrico + sostegno	
11	23+270		accettabile		
12	23+385	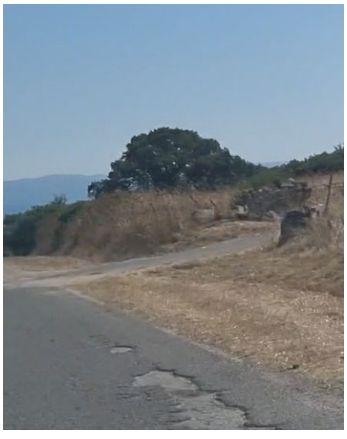	segnale di precedenza e sostegno assenti	fornitura e posa segnale precedenza + sostegno .	

NUM	PROGRES-SIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSER-VAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
13	23+530		accettabile		
14	23+618		accettabile		
15	23+915		lievemente fuori piombo		
16	24+000	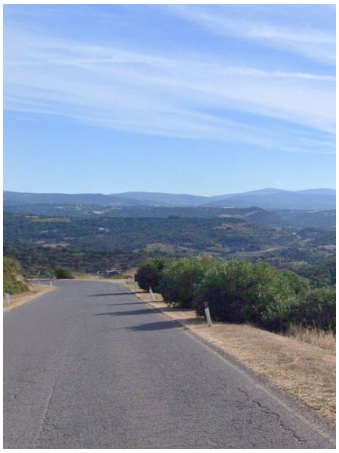	cippo chilometrico assente	fornitura e posa di cippo chilometrico + sostegno	

NUM	PROGRES-SIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSER-VAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
17	24+132 24+151	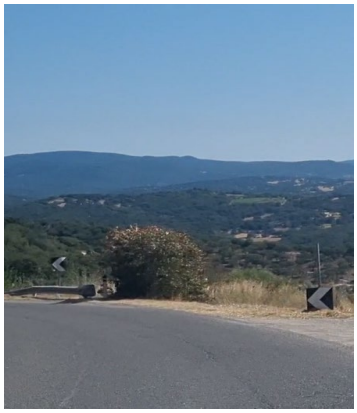	degradati	fornitura e posa di n. 3 delineatori di curva + 1 sostegno	
18	24+633		sbiadito+ storto	nuovo sostegno e segnale di pericolo curve pericolose .	
19	24+722 24+742 24+762 24+780 24+798		sbiaditi	fornitura e posa di n. 5 delineatori di curva	
20	24+847		sbiaditi	sostituzione segnali stradali	

NUM	PROGRES-SIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSER-VAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
21	24+920		accettabile		
22	24+995	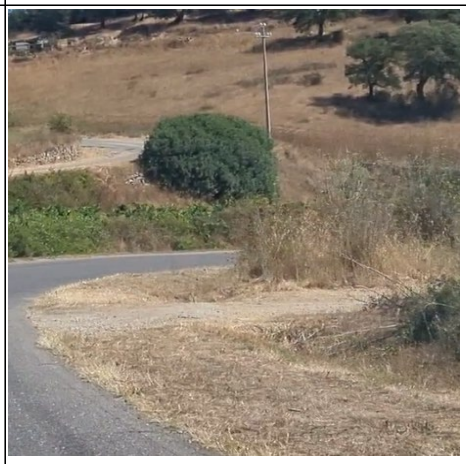	segnale di precedenza e sostegno assenti	fornitura e posa segnale precedenza + sostegno .	
22b	25+000	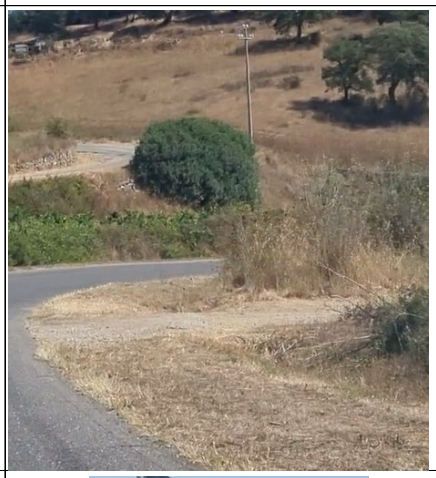	cippo chilometrico assente	fornitura e posa di cippo chilometrico + sostegno	
23	25+222		accettabile		

NUM	PROGRES-SIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSER-VAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
24	25+262		accettabile		
25	25+362 25+673 25+684		degradati		sostituzione segnali
26	25+405		accettabile		
27	25+483		accettabile		

NUM	PROGRES-SIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSER-VAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
28	25+645		segnale di precedenza e sostegno assenti	fornitura e posa segnale precedenza + sostegno .	
29	25+741 25+745		segnali sbiaditi	fornitura e posa di nuovi 3 delineatori e 2 sostegni .	
30	25+761		segnale pericolo incrocio a destra assente	fornitura e posa segnale pericolo incrocio a destra .	
31	25+853		accettabile		

NUM	PROGRES-SIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSER-VAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
32	25+896		segnale di precedenza e sostegno assenti	fornitura e posa segnale precedenza + sostegno .	
33	25+986		accettabile		
34	26+000		cippo chilometrico non leggibile	cippo chilometrico da sostituire	
35	26+133		accettabile		

36	PROGRES-SIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSER-VAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
36	26+240		accettabile		
37	26+298	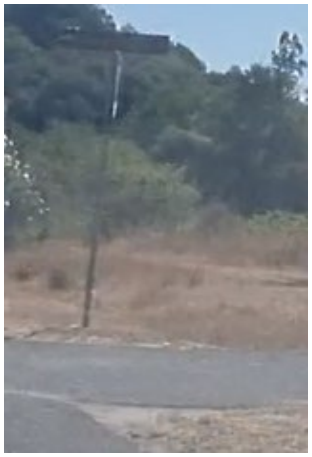	accettabile		
38	26+313		sbiadito	segnale di pericolo e integrativo da sostituire, segnale di divieto da fissare	
39	26+480		segnale di pericolo incrocio doppio assente	fornitura e posa di sotegno e segnale pericolo incrocio doppio .	

NUM	PROGRES-SIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSER-VAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
40	26+620		leggermente danneggiato		
41	26+833		accettabile		
42	26+880 26+882 26+884		accettabile		
43	27+000		cippo chilometrico non leggibile	cippo chilometrico da sostituire	

NUM	PROGRES-SIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSER-VAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
44	27+044		accettabile		
45	27+154		sbiaditi	segnale di pericolo sbiadito da eliminare - altro segnale da riposizionare	
46	27+192		segnale di limite di velocità sbiadito	sostegno da rimettere in asse sostituzione segnale di limite velocità	
47	27+240	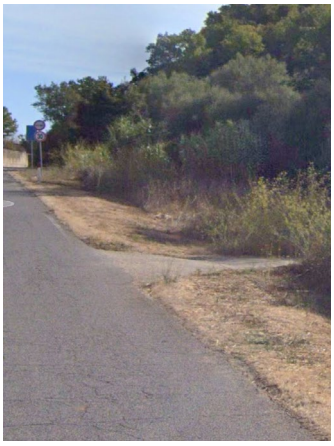	segnale di precedenza e sostegno assenti	fornitura e posa segnale precedenza + sostegno .	

NUM	PROGRES-SIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSER-VAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
48	27+278		segnali sbiaditi	sostituzione segnali di divieto	
49	27+292		segnale danneggiato e sostegno fuori asse		sostegno da rimettere in asse sostituzione del segnale
50	27+343		accettabile		
51	27+580		segnale lievemente danneggiato		

NUM	PROGRES-SIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSER-VAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
52	27+627		segnale sbiadito		segnale da sostituire
53	27+722	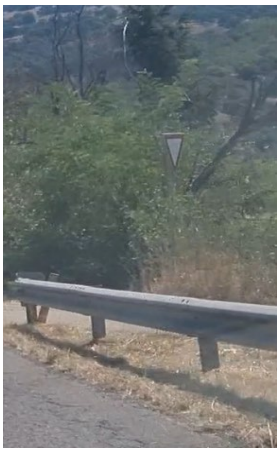	accettabile		
54	27+836		accettabile		
55	27+927		accettabile		

NUM	PROGRES-SIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSER-VAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
56	27+938		accettabile		
57	28+000		cippo non leggibile	sostituzione cippo	
58	28+010		accettabile		
59			accettabile		

NUM	PROGRES-SIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSER-VAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
60	28+270		accettabile		
61	28+294 28+304 28+014		accettabile		
62	28+665		accettabile		
63	28+580		segnale pericolo incrocio a sinistra assente	fornitura e posa soetegno e segnale pericolo incrocio a destra	

NUM	PROGRES-SIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSER-VAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
64	28+902	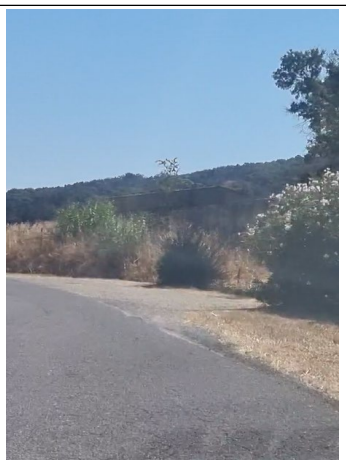	segnale indicazione piazzola di sosta non più presente		fornitura e posa di segnale piazzola di sosta
65	28+950	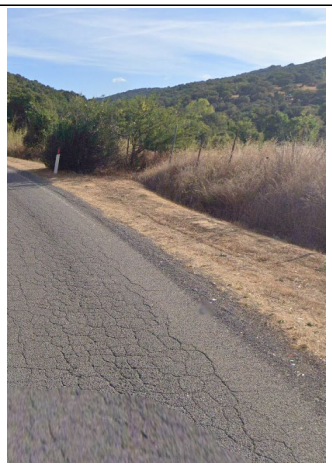	segnale pericolo incrocio a sinistra assente	fornitura e posa sostegno e segnale pericolo incrocio a destra	
66	29+000		cippo chilometrico non leggibile	cippo chilometrico da sostituire	
67	29+280 29+290 29+300	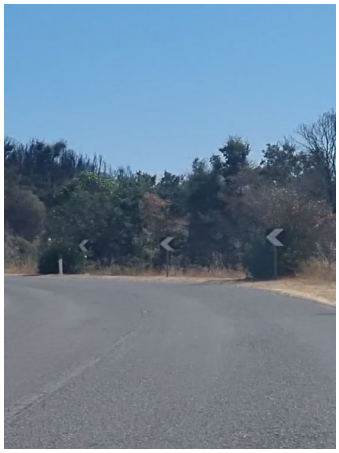	accettabile		

NUM	PROGRES-SIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSER-VAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
68	29+380		segnale limite provincia cippo chilometrico		sostituzione segnale limite provincia

NUM	PROGRES- SIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSEVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
69	29+360		segnale di pericolo danneggiato e sbiadito	sostituzione segnale integratico e di pericolo	
70	29+240	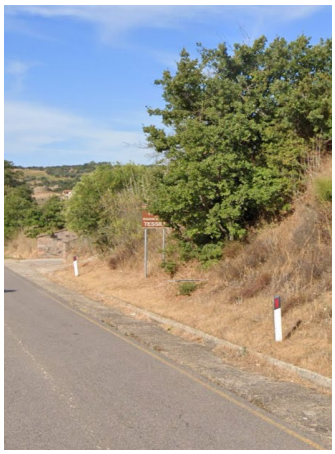	segnale pericolo incrocio a destra assente	fornitura e posa di sostegno e segnale pericolo incrocio a destra .	
71	29+088		segnale di precedenza e sostegno assenti	fornitura e posa di sostegno segnale precedenza .	
72	28+890		segnale pericolo incrocio a destra assente	fornitura e posa di sostegno e segnale pericolo incrocio a destra .	

NUM	PROGRESSIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSEVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
73	28+727	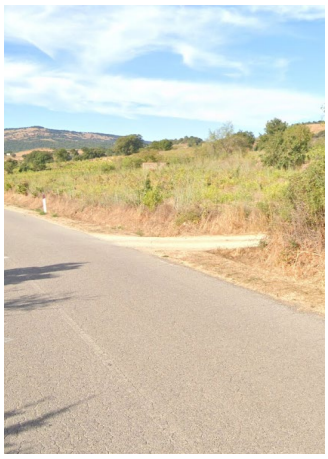	segnale di precedenza e sostegno assenti	fornitura e posa di sostegno e segnale precedenza .	
74	28+510		accettabile		
75	28+403		accettabile		
76	28+138		accettabile		

NUM	PROGRESSIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSEVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
77	28+020		accettabile		
78	28+005		accettabile		
79	27+858		accettabile		
80	27+804	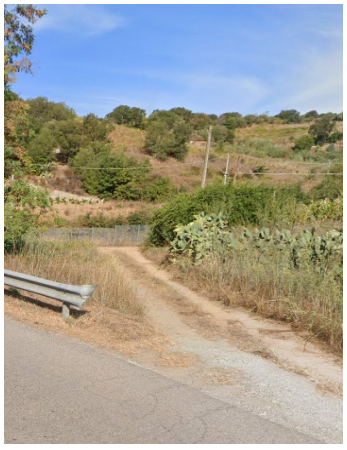	segnale di precedenza e sostegno assenti	fornitura e posa di sostegno e segnale precedenza .	

NUM	PROGRESSIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSEVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
81	27+740		accettabile		
82	27+665			sostituzione segnale di percolo dosso	
83	27+623		segnali di divieto sbiaditi	sostituzione segnali divieto sorpasso e limite velocità da 30 a 50 km/h	
84	27+405		su intersezione con strada comunale Samugheo Sorgono manda segnale di dvieto di accesso	fornitura e posa di sostegno e segnale di divieto di accesso / senso vietato .	

NUM	PROGRESSIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSEVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
85	27+405		su intersezione con strada comunale Samugheo Sorgono segnale di direzione obbligatoria da fissare	fissaggio segnale di direzione obbligatoria	
86	27+355		sbiadito	sostituzionea di segnale di divieto di accesso / senso vietato	
87	27+345		segnale di precedenza sbiadito sostegno danneggiato	sostituzione di segnale di sostegno e di precedenza	
88	27+310		segnale di pericolo da fissare al sostegno	rotazione e fissaggio cartello al supporto	

NUM	PROGRESSIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSEVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
89	27+225		accettabile		
90	27+180		segnale di precedenza sbiadito	sostituzione di segnale di precedenza e taglio vegetazione	
91	27+131		accettabile		
92	26+978		segnale di precedenza sbiadito e nascosto dalla vegetazione	sostituzione di sostegno e segnale di precedenza e taglio vegetazione	

NUM	PROGRESSIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSEVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
93	26+797		segnale di pericolo da spostare alla progressiva 26+700	smontaggio segnale esistente e posa di nuovo segnale di pericolo incrocio .	
94	26+698	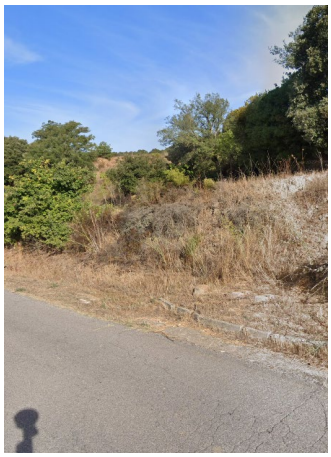	segnale di di pericolo curve pericolose da spostare dalla progressiva 26+797	nuovo sostegno e segnale di pericolo curve pericolose	
95	26+640		accettabile		
96	26+400	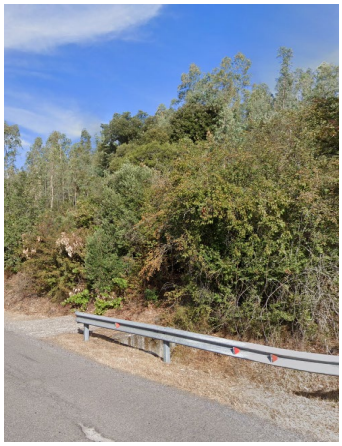	segnale di pericolo incrocissente	fornitura e posa di sostegno e segnale di pericolo	

NUM	PROGRESSIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSEVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
97	26+280		segnali sbiaditi	segnali esistenti da sostituire	
98	26+220		segnale di precedenza e sostegno assenti	fornitura e posa di sostegno segnale precedenza	
99	26+210		accettabile		
100	26+113		segnale pericolo incrocio a destra assente	fornitura e posa di sostegno e segnale pericolo incrocio a destra . .	

NUM	PROGRESSIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSEVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
101	26+098	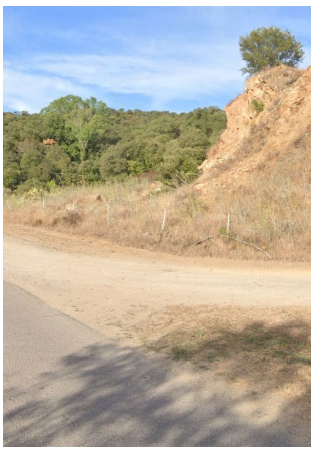	segnale di precedenza e sostegno assenti	fornitura e posa di sostegno e segnale precedenza .	
102	26+065	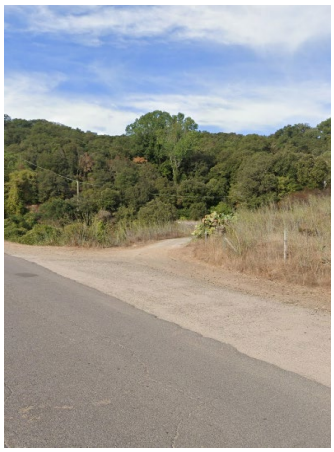	segnale di precedenza e sostegno assenti	fornitura e posa di sostegno e segnale precedenza .	
103	25+990		accettabile		
104	25+972 25+958 25+946	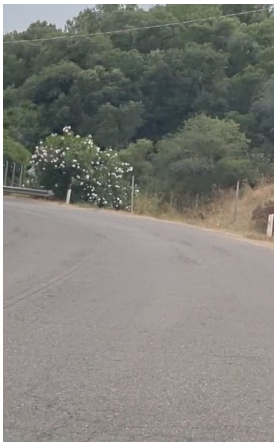	n. 2 delineatori di curva assenti su 3 sostegni presenti	fornitura e posa di n. 3 sostegni e delineatori di curva	

NUM	PROGRESSIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSEVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
105	25+940		accettabile		
106	25+870		segnale di pericolo non visbile per presenza vegetazione	taglio vegetazione limitorfa al segnale	
107	25+815		accettabile		
108	25+603		accettabile		

NUM	PROGRESSIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSEVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
109	25+315		sbiadito	Segnale di pericolo da sostituire	
110	25+121		sostegno dannegiato	sostituzione del sostegno	
111	25+100		presenti 2 delineatori di curva di cui uno dannegiato	fornitura e posa di n. 3 delineatori di curva completi di sostegni ,	
112	25+000		accettabile		

NUM	PROGRESSIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSEVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
113	24+955		accettabile		
114	24+945		accettabile	accettabile	
115	24+380		segnale di pericolo non totalmente visbile per presenza vegetazione	taglio vegetazione limitorfa al segnale	
116	23+778		segnale di pericolo non totalmente dalla visbile dalla distanza per presenza vegetazione	taglio vegetazione limitorfa al segnale	

NUM	PROGRESSIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSEVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
117	23+644		segnale pericolo incrocio a destra assente	fornitura e posa di sostegno e segnale pericolo incrocio a destra . .	
118	23+522		segnale diprecedenza ruotato	rotazione e fissaggio del segnale di precedenza	
119	23+100		segnale di pericolo dosso e di limite di velocità sbiaditi	sostituzione segnale di pericolo dosso e di limite di velocità	
120	22+963		segnale di stop nascosto dalla vegetazione	taglio della vegetazione intorno al segnale di stop	

NUM	PROGRESSIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSEVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
121	22+678		segnale pericolo dosso ruotato	rotazione, riposiziona-mento e fissaggio cartello al sostegno	
122	22+649		supporto fuori asse	riposizione - mento secondo la verticale del supporto	
123	22+624		supporto fuori asse	riposizione - mento secondo la verticale del sostegno	
124	22+330	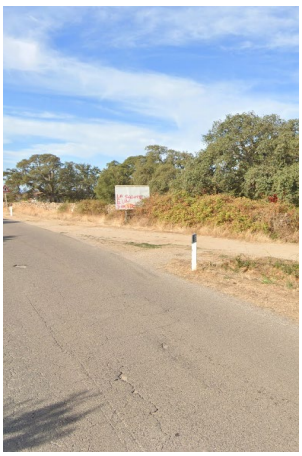	segnale di precedenza e sostegno assenti	fornitura e posa di sostegno e segnale precedenza	

NUM	PROGRESSIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSEVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
125	22+310		segnale danneggiato ma leggibile		sostituzione segnale pericolo incrocio a destra
126	22+130		segnale di precedenza e sostegno assenti	fornitura e posa di sostegno e segnale precedenza	
127	22+092	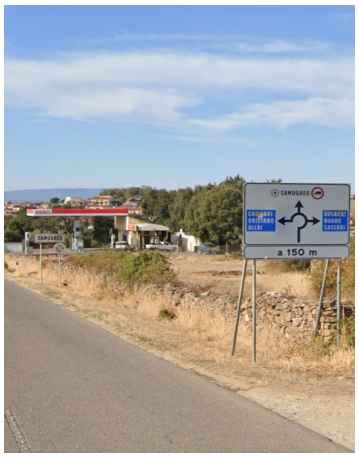	accettabile		
128	22+060		segnale di inizio centro abitato e limite di velocità	posa nuovi segnali di divieto + spostamento segnale informativo	

NUM	PROGRESSIVA	IMMAGINE	STATO DI CONSEVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	DA REALIZZARE CON ALTRO INTERVENTO
129	21+940		mancanza di segnali di pericolo rotatoria e di preavviso di obbilgo di precedenza	posa di sostegno e nuovi segnali stradali di pericolo e preavviso 	
130	21+920		segnale fine strada con diritto di precedenza sbiadito	segnale da sostituire	
131	21+810		segnale indicazione piazzola di sosta non più presente		fornitura e posa di segnale piazzola di sosta
