



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti




REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE VIABILITA'

MESSA IN SICUREZZA A TRATTI SALTUARI DELLA S.P. N. 33 DA FINE ABITATO DI SAMUGHEO A LIMITE PROVINCIA NUORO

CUP: F87H22004580001

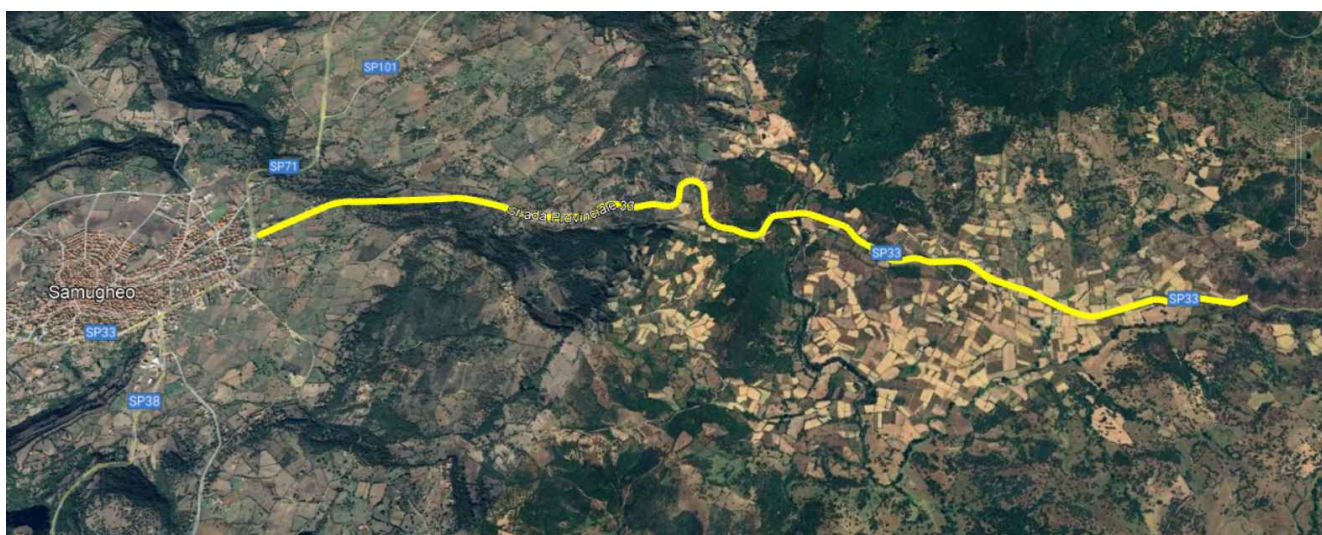

PROGETTO ESECUTIVO

Il committente Provincia di Oristano Settore Viabilità Dirigente Responsabile Ing. Giuseppe Pinna		Il Responsabile del Procedimento Geom. Pier Paola Corrias		Verifica progettazione	
Studio di Ingegneria Civile Ing. Raimondo MANCA Via Cagliari, 56 - 09170 - Oristano tel. 0783 649145 - cell. 349 7513442 - fax 07831920142 e.mail: ing.manca@tiscali.it PEC: raimondo.manca@ingpec.eu		Il progettista Ing. Raimondo Manca		data marzo 2025	approvazione
				formato A4	
				aggiornamenti	
titolo				file	redato da R.M.
				serie 1,8,5	allegato PSC-A
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DIAGRAMMA DI GANTT				scala	

ALLEGATO "A"

Comune di Oristano
Provincia di ORISTANO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA A TRATTI SALTUARI DELLA S.P. N. 33 DA FINE ABITATO DI SAMUGHEO A LIMITE PROVINCIA NUORO
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ORISTANO.
CANTIERE: S.P. N. 33 DA FINE ABITATO DI SAMUGHEO A LIMITE PROVINCIA NUORO, Oristano (ORISTANO)

ORISTANO, marzo 2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Manca Raimondo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(GEOMETRA CORRIAS Pier Paola)

Ing. Manca Raimondo

Via Cagliari, 56
09170 Oristano (Oristano)
Tel.: 0783 649145 - Fax: 07831920142
E-Mail: ing.manca@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
Preparazione delle aree di cantiere				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2
Apprestamenti del cantiere				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1
FASI DI LAVORO				
Pulizia e manutenzione delle cunette alla francese	1	E	24	32
Asportazione di strato di usura	1	E	2	2
Pulizia di sede stradale	1	E	4	6
Stesa ancoraggio (emulsione bituminosa)	1	E	14	18
Formazione di manto di usura	1	E	14	18
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	5	5
Posa di segnaletica verticale	1	E	11	15
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2
<p>LEGENDA:</p> <p>Z = ZONA</p> <p>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</p> <p>1) = ZONA UNICA</p> <p>I = IMPRESA</p> <p>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</p> <p>1) = APPALTATRICE</p> <p>2) = SUBAPPALTATRICE SEGNALETICA</p> <p>E <Nessuna impresa definita></p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>				

